

## RELATÓRIO DE VISTORIA CONSTATAÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar informações relativas ao convênio nº 035/2021, cujo objeto é a Pavimentação asfáltica no município de Porto Nacional - TO, Referente ao Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego, através desta Agência Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO e o município de Porto Nacional - TO, publicado no Diário Oficial do Tocantins nº 5995, página 73, de 27 de dezembro de 2021.

A obra foi vistoriada dia 11 de agosto de 2023, tendo-se constatado que o contrato no valor de R\$ 2.039.869,76 conta esses serviços de drenagem pluvial e que já foi medido o valor de R\$ 1.177.502,03 correspondendo a 57,72% referente a primeira, segunda e terceira medições, ficando apto a receber a segunda parcela do convênio a cima citado.

Informamos que o serviço de terraplanagem e pavimentação asfáltica já foi executado e serviço de drenagem superficial em andamento.

### QUADRO RESUMO

Local	Comp.(m)	Larg.(m)	Área (m <sup>2</sup> )	Coordenadas de referência
AV. E (Pista Dupla)	1133,44	7	7934,08	Av. a ser pavimentada

## Relatório Fotográfico

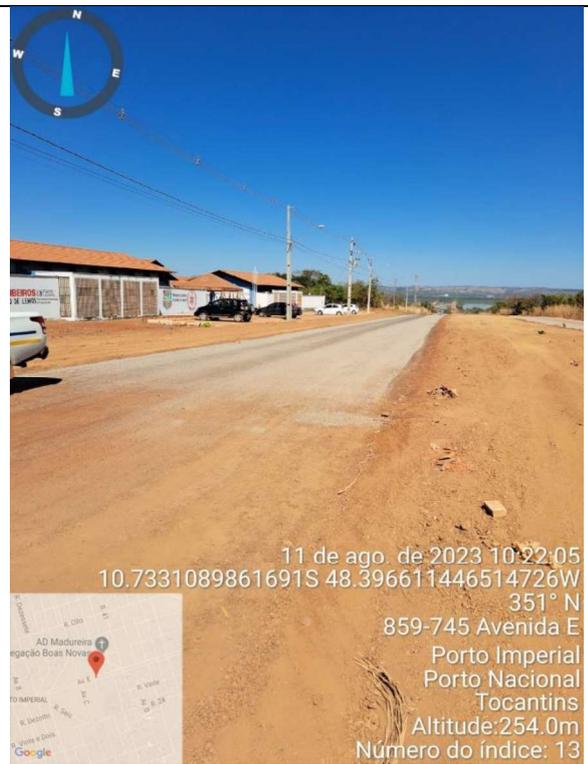


Foto 01


Foto 02



Foto 03

Foto 04

## Mapa de localização

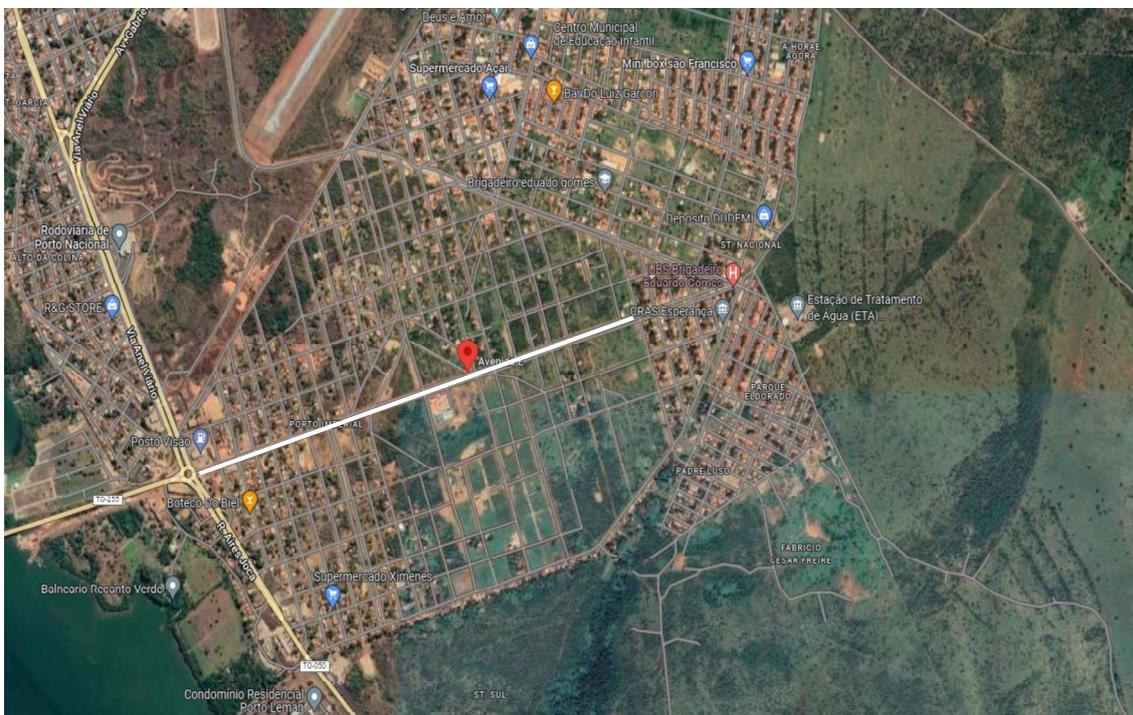

Localção das vias pavimentadas



Eng. Osvaldo Rocha Dourado  
CREA 1900/D-GO/TO
